TERVEGYEZTETÉSI ÉS TULAJDONOSI NYILATKOZAT

Tárgy: Kaposvár közép 8 FTTH kiviteli terve

Tervszám: 1000006610

Építtető: Magyar Telekom Nyrt. 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.

Építési mód: új optikai kábel építése

Érintett telek: Kaposvár 571 HRSZ

Tulajdonos adatai:

Jogállás: társasháztulajdon
Cím: 7400 Kaposvár, Szántó utca 50/B.

Képviselő:


Neve: Társasház kezelői és Informatikai kft, Császár Ildikó ügyvezető
E-mail: tarsashaz@th-info.hu
Telefon: +36 20 914 0437

A képviselő nyilatkozata:

A társasház kezelőjeként nyilatkozok, mint a 2003. évi C. tv. 99/B. § szerinti épületen belüli fizikai infrastruktúrával rendelkezni jogosult személy, hogy a tárgyi telken és épületen az alábbi műszaki megoldássokkal járulok hozzá az építéshez.

Műszaki megoldás:


Az épület ellátását a Szántó utca 50/A és 50/B közötti közterületen földben kiépülő hálózatról tervezzük. Az 50/B épület 571 HRSZ-ú ingatlanának jogi telek határa (kék szaggatott vonal) kb az épület melletti járda vonalában van. A hozzájárulás az épület elérésére és az épületen beüli építést tartalmazza.
A tervezett építés helyszín rajza:

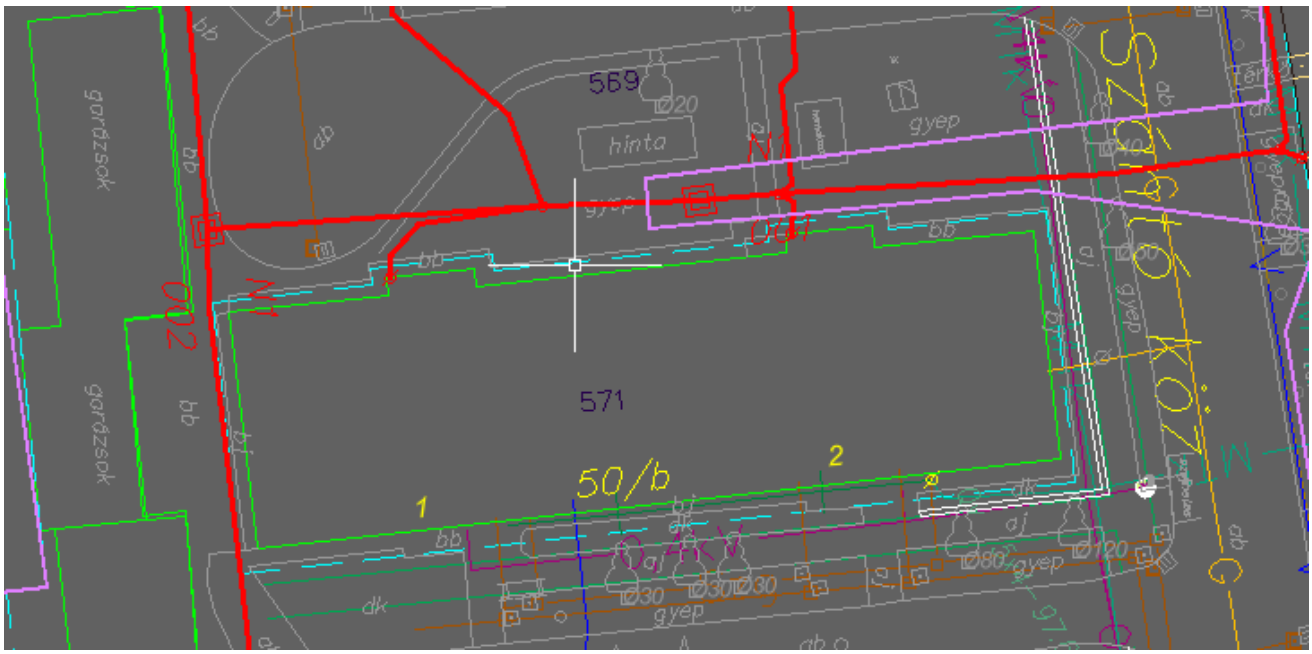

Mindkét lépcsőházba a bevezetést a két ház közötti tér felől lépcső alatt tervezzük. Az emeleti ellátásokat a lépcsők végénél a vízszintes tartó gerendák mellett készítendő födém átfúrásokkal tervezzük. A vízszintes gerendákat megfúrni tilos!

1. lépcsőház tervezett kábel vezetések:

Bevezetés:

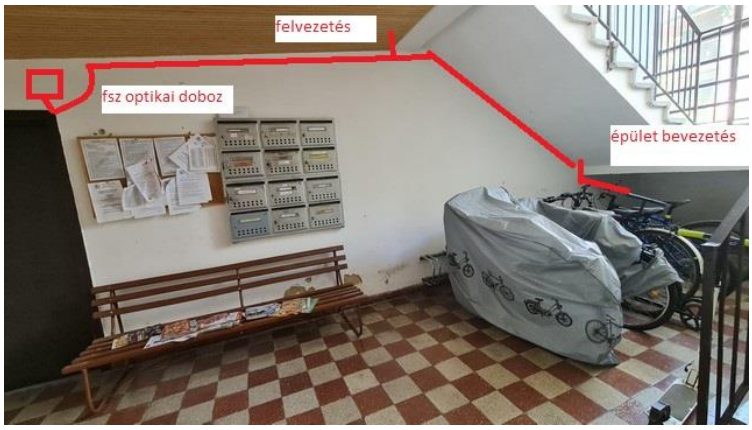

Szinti felszálló kábelek:



2. lépcsőház bevezetés:



A felszálló kábel a földszinti mennyezet burkolatába érkezik. A burkolat csavarral és szegekkel van rögzítve nem leszedhető, ezért a felvezetés helyén kivágjuk és a burkolatba nyitható szerelő ablakot építünk.



A szinti dobozokat a felvezetések mellett helyezzük el. Szolgáltatási igény esetén ezekből a dobozokból történik a lakások bekötése. A lakások bekötése nem része a projektnek.

Az erősáramú szekrényekben a mérőórák cseréje megtörtént a régi kábelezés felhasználásával. A kábelezés rekonstrukciója még nem valósult meg, ezért az erősáramú szekrénybe nem tervezünk új építést.

Károkozás esetén a helyreállítási költség a kivitelezőt terheli.

A munkavégzés megkezdése előtt a kezelőt értesíteni kell.

Kaposvár, 2026. 09. „ …..”

……
képviselő
